



PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"

Programmazione 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso congiunto MIUR - MATM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

CUP Intervento C-1 : F68G10001490007


CUP Intervento C-2 : F68G10001550007

CUP Intervento C-3 : F68G10001590007

CUP Intervento C-4 : F68G10001660007

CUP Intervento C-5 : F68G10001710007

Codice : NAPC 09000V

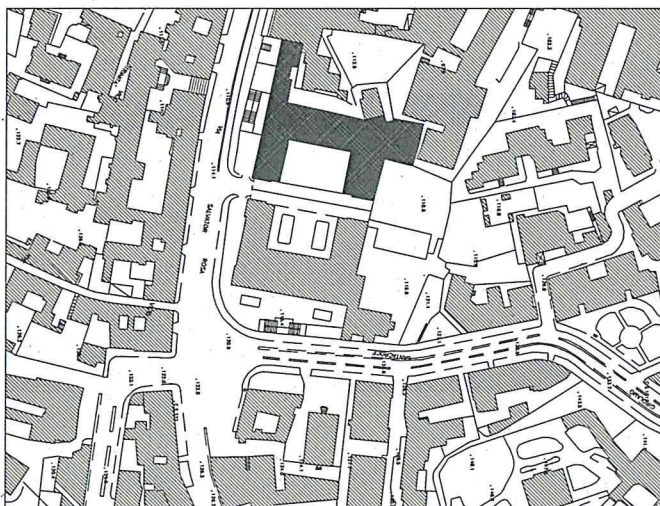

LICEO GINNASIO STATALE G. B. VICO

Via Salvator Rosa, 117
NAPOLI

ELAB. N°:

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO ESECUTIVO
Cronoprogramma con
Diagramma di Gantt

SCALA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RUP

prof.ssa Maria Clotilde Paisio

IL SUPPORTO al RUP

ing. Vincenzo Brandi

I PROGETTISTI

arch. Gerardo Strazzullo - geom. Valeria Pizzuto



CATEGORIE DI LAVORAZIONI	IMPORTI	N° SETTIMANE	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
OPERE PROVVISORIALI- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI- TAGLI-SCAVI-RINTERRI	28.876,59	18	4	2	2	2	2		2		2		2	
		18	6417,02	3208,51	3208,51	3208,51	3208,51	0,00	3208,51	0,00	3208,51	0,00	3208,51	0,00
TRASPORTO A RIFIUTO	16.315,62	5			0	1	1	0	0	1	1	1		
		5	0,00	0,00	0,00	3263,12	3263,12	0,00	0,00	3263,12	3263,12	3263,12	0,00	0,00
MASSI E MASSETTI	78.322,22	11		2	2	2	1	2		2				
		11	0,00	14240,40	14240,40	14240,40	7120,20	14240,40	0,00	14240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO MURATURE	64.712,59	7		1	1	1	1	1	1	1	0	0		
		7		9244,66	9244,66	9244,66	9244,66	9244,66	9244,66	9244,66				
INTONACI	63.721,55	4	0	0	1		1	1	0	0			1	
		4		0,00	15930,39	0,00	15930,39	15930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15930,39	0,00
Oneri sicurezza estrinseci	8.743,19	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
		1	874,32	874,32	874,32	874,32	874,32	874,32	874,32	874,32	874,32	874,32	0,00	0,00
TRAMEZZATURE	1.136,14	5				1		1		1		1	1	
		5	0,00	0,00	0,00	227,23	0,00	227,23	0,00	227,23	0,00	227,23	227,23	0,00
TINTEGGIATURE	22.666,16	6					1,00		1,00		1,00	1,00	2,00	
		6					3777,69		3777,69		3777,69	3777,69	7555,39	
SERRAMENTI INTERNI ed ESTERNI	25.512,56	6			2,00			2,00		2,00				
		6			8504,19			8504,19		8504,19				
PAVIMENTI	27.155,90	7		1	1	1	1		1	2			0	2
		7	0,00	3879,41	3879,41	3879,41	3879,41	0,00	3879,41	3879,41	0,00		0,00	3879,41
RIVESTIMENTI	10.820,38	7		1	1	1	1		1	1			0	1
		7	0,00	1545,77	1545,77	1545,77	1545,77	0,00	1545,77	1545,77	0,00		0,00	1545,77
OPERE IN FERRO	35.256,69	7		0,80852	2	4	4		4	4			0	4
		6		1249,78	3091,54	6183,07	6183,07	0,00	6183,07	6183,07	0,00		0,00	6183,07
IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO	25.574,50	7		0	0,5	1	1		2	0			0	1,04467
		7	0,00	0,00	1826,75	3653,50	3653,50	0,00	7307,00	0,00	0,00		0,00	9133,75
IMPIANTO ELETTRICO E TERMIC	89.363,89	7		0,88	1	1	2		2	2				0,089205
		7	0,00	11234,32	12766,27	12766,27	17486,38	0,00	17486,38	17486,38	0,00		0,00	137,89
ONERI DI SMALTIMENTO	12.426,84	7		1	1	1	1		1	1			0	1
		7	0,00	1775,26	1775,26	1775,26	1775,26	0,00	1775,26	1775,26	0,00		0,00	1775,26
ARREDI,SERVOSCALA E VARIE	123.164,25	7		0	1	1	1		1	1			0	2
		7	0,00	17594,89	17594,89	17594,89	17594,89	0,00	17594,89	17594,89	0,00		0,00	17594,89
totali	633.769,07	76												
IMPORTO PREVISTO NEL MESE			7.291,34	64.847,33	94.482,36	78.456,42	95.537,18	49.021,18	72.876,97	84.818,71	11.123,65	8.142,36	26.921,51	40.250,04
IMPORTO PREVISTO PROGRESSIVO			7.291,34	72.138,67	166.621,03	245.077,45	340.614,63	389.635,81	462.512,79	547.331,49	558.455,14	566.597,50	593.519,01	633.769,06
percentuale sul totale			1,2%	11,4%	26,3%	38,7%	53,7%	61,5%	73,0%	86,4%	88,1%	89,4%	93,6%	100,0%
